

平成30年11月27日の進捗状況

平成30年11月27日の進捗状況についてお知らせします。

建物本体の基礎工事を海側よりA工区、B工区、C工区の3つの工区に分けて行っています。

写真1は、上空からの施工状況で左が海側となります。

写真2は、A工区でピットの土間コンクリートの打設を行っています。


写真3は、B工区で地中梁のコンクリート打設後の型枠を取り外しています。

写真4は、C工区で地中梁の鉄筋組み立てを行っています。

【写真1】 ※11月27日撮影



【写真2】 ※11月27日撮影

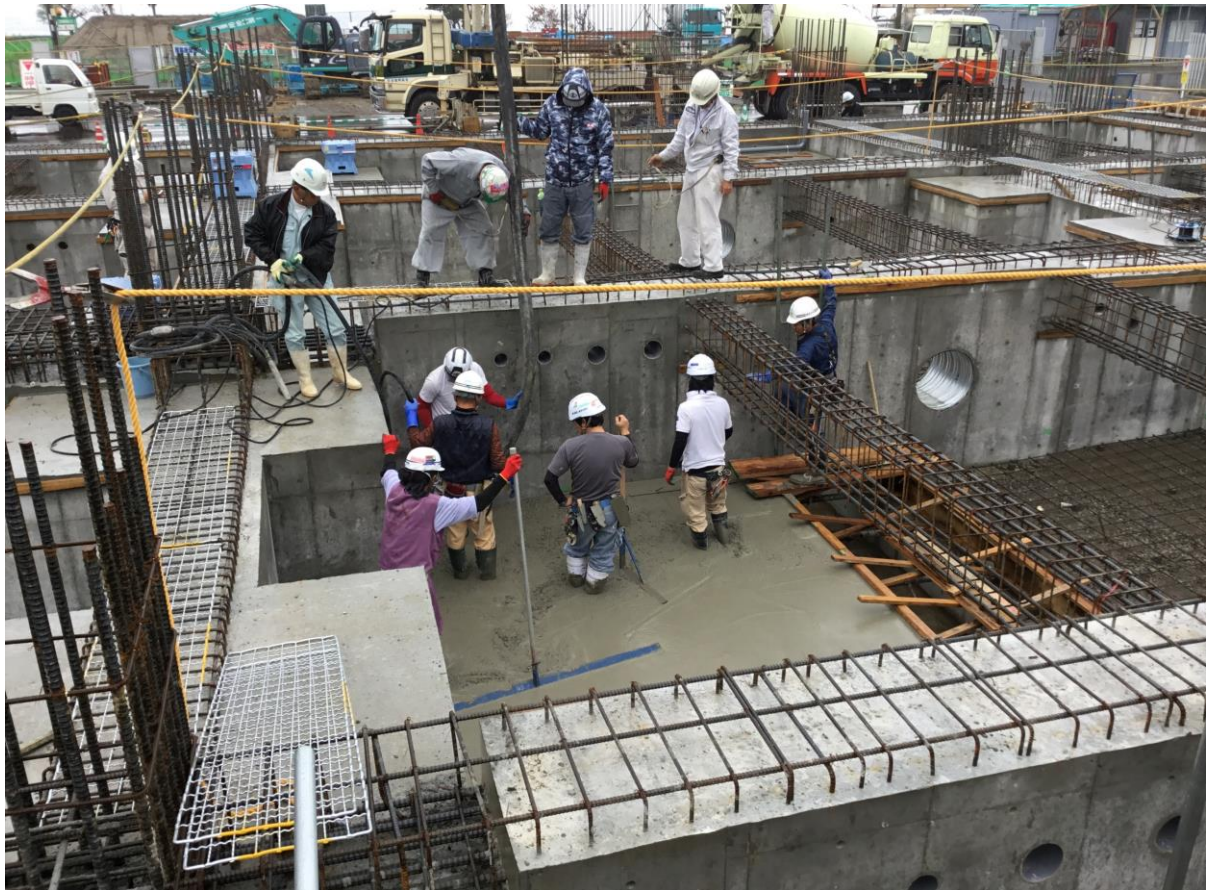

【写真3】 ※11月27日撮影



【写真4】 ※11月27日撮影

